Sommaire

REMERCIEMENTS.....5
RESUME EXECUTIF.....6
INTRODUCTION.....9
I. DESCRIPTION DU PROJET.....10
.....10
.....11
.....12
.....14
ETENDUE DE L'EVALUATION ET DEMARCHE METHODOLOGIQUE.....15
2.1. Etendue de l'évaluation et les objectifs.....15
2.2. Principes méthodologiques et limites de l'évaluation.....15
.....15
.....15
н.о. Méthodologie de l'évaluation 16
2.4. Difficultés rencontrées et limites de la méthodologie.....19
.....20
3.1. PERTINENCE DU PROJET.....20
.....

Â

échanges entre les jeunes et surtout sur la consolidation de leurs associations qui sont relativement « jeunes »

jeunes et la mobilisation des ressources internes à travers en partie le développement des filières agricole des filières

tâche, elle a travaillé avec pour élaborer ce rapport qui, à notre humble avis, reflète les réalités du terrain.

Le projet a démarré en mars 2018 et est porté par le consortium ACORD/WANEP et RAJGUI pliqués dans la consolidation de la paix. Ce projet vise à mettre en place des mécanismes de dialogue de paix au niveau communautaire et de concertation entre les groupes de jeunes hommes, femmes et filles (H/F), plus particulièrement, le renforcement des dispositifs de prévention et précoce et de réponse rapide sensible au genre et animé par les jeunes H/F.

Le présent document constitue le rapport de synthèse des données collectées sur le terrain dans les treize (13) sur les 18 communes partenaires du projet.

I. DESCRIPTION DU PROJET

Les jeunes (garçons et filles, hommes et femmes) ne sont point épargnés dans le contexte ci dessus décrit. Ils sont malheureusement à la fois les principaux acteurs et les principales victimes de ces tensions et violences. Les grandes villes du pays (Conakry, Kankan, Siguiri,

politiques, en particulier à l'approche des compétitions électorales ou après la proclamation des résultats des élections.

Les jeunes sont particulièrement sujets aux manipulations des acteurs politiques du fait de leur situation de vulnérabilité et de marginalisation sociale et économique. En particulier la situation [1] contribue à les maintenir dans du désespoir. Ces situations sont encore plus accentuées chez les jeunes filles et les femmes et

et aussi le petit commerce ambulant avec ses facteurs de risques. En plus, la scolarisation aux niveaux • ‡ … ' • † ƒ ‹ " ‡ ‡ – • — ' ± " ‹ ‡ — " ‡ • – „ ‡ ƒ — … ' — ' ' Ž — • ˆ ƒ ‹ „ Ž ‡ á femmes/filles avec des pourcentages de 23% dans le secondaire et 6% dans le supérieur contre 37% et 14% respectivement pour les hommes.

Toutes ces formes de vulnérabilités connues par ces jeunes hommes et femmes contribuent aussi à leur marginalisation en ce qui concerne leur participation dans les processus et instances de prise de décision et dans les mécanismes de gouvernance locale. Cette marginalisation réduit leur appropriation des dynamiques locales de développement,

touchent ces jeunes.

1.2. Présentation du projet, résultats stratégiques et produits attendus :

Le tableau ci-dessous présente les résultats stratégiques et les produits attendus du projet :

- Comité Technique du PBF

1.3.4. Unité de Gestion du Projet (UGP)

Sous la coordination du chef de file du consortium (ACORD), l'UGP a établi un plan

Elle a bénéficié

et consolidation de la paix.

II.

(*) L'ï‡ˆˆ‹…ƒ…‹–± •‡ •‡•—"‡ 'ƒ" …'•'ƒ"ƒ«objectifs•ou"résultats attendus) et le réalisé (résultats)). La flèche passe par les activités pour montrer que cette analyse oblige à un relevé des différentes ƒ…–‹˜‹–±• •‡•±‡• ''—" ˜'‹" †ƒ•• "—‡ŽŽ‡ •‡•—"‡ ‡ŽŽ‡• 'ˆ"•‡––‡•– †ï'„–‡•‹" Ž

ï‡ˆˆ‹…ƒ…‹–É ®.†.‹ð'–•‹–‹ˆ‹…ƒ…‹–É manière de faire) c'est-à-dire dans le cas qui nous occupe ce qui explique dans la manière de gérer le partenariat (de mobiliser les "‡••'—"…‡•á †‡ •—‹les résultats obtenus. Les résultats peuvent différer dans ce cas selon les activités.

Dans cette grille le partenariat joue un rôle central car il lie les différents partenaires publics et de la Société Civile (SC) autour du projet et ses objectifs :

- Les objectifs du partenariat/projet sont pertinents au regard du contexte et de ses enjeux ?
- La structure du partenariat parvient à mener ses actions avec efficience et efficacité ?
- Les résultats obtenus ont un impact sur le contexte ? Permettent-ils de viabiliser la structure ?

III. CONSTATS ET ANALYSES DES CRITERES

3.1. PERTINENCE DU PROJET

3.1.1. P

© Etc.

3.1.3. Pertinence par rapport aux priorités du SNU en Guinée

Le présent projet est en parfaite adéquation avec la stratégie nationale de la Guinée structurée

en

es activités du projet). Nous y reviendrons.

Les responsabilités de la gestion financière des ressources sont confiées à ACORD en tant qu

COÛTS SUPLEMENTAIRES	305 827	282 652	23 175	92%	
Coûts de personnel	52 808	54 462	(1 654)	103%	ACORD
Coûts opérationnels du proje	128 293	128 872	(579)	100%	
Budget de S & E du projet	69 119	43 711	25 408	63%	
Coûts indirects (7%):	55 607	55 607	0	100%	
TOTAL PROJET BUDGET					

des fonds. Ensuite ces fonds sont envoyés au niveau de chaque structure d'exécution pour la

Sur présentation des rapports narratifs et financiers du trimestre, une nouvelle planification pour le trimestre à venir est réalisée afin d'assurer la continuité des services. Cette pratique n'a pas connu de difficultés majeures de nature à entraver l'exécution correcte du projet. Le

responsable suivi-évaluation et les moniteurs terrain du projet.

Un dispositif de suivi des indicateurs de performance (plan de suivi) a été mis en place pour mesurer les progrès réalisés et cela a permis de renforcer la participation des autres acteurs

3.3. Efficacité du projet

L'analyse de l'efficacité a été faite sur la base de deux (2) résultats attendus de la chaine des résultats : Résultats

_		ONNEES		
#	ACTIVITES/SOUS ACTIVITES/TACHES	ï		• „
		Non commencées	En cours	Achevées
1	Elaborer les sous	0	0	1
2	Recruter/ou redéployer le personnel duprojet et leur orientation (ACORD/WANEP/RAJGUI)	0		

11	des structures de réponse. (WANEP)	0	0	1
12	Mettre en place et former l	0	0	1
13	identifiés et leur impact sur les jeunes H/F au niveau local, préfectoral et régional et orienter les initiatives de réponse qui prendront en considération les besoins spécifique des jeunes H/F et seront menées par les structures habiletés. (WANEP)	0	0	1
14	et la réponse rapide.. (WANEP)	0	0	1

Tableau : Niveau de partenariat

N°	Différentes phases	Actions de partenariat programmées pour la période.	Réalisations dans le cadre du partenariat.
1	Formulation du projet	Le processus de formulation du projet a	

		partie nationale et le Secrétariat Permanent du PBF en Guinée, aspect qui méritait d'être renforcé et multiplié.	
5	Suivi des activités	Le suivi quotidien des activités est assuré par chaque partenaire du Consortium et la supervision globale est assurée par le Ministère de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté à travers le Comité de pilotage et le Comité technique	Une réunion du Comité de pilotage a été organisée Plusieurs réunions de Comité technique sur le projet ont été réalisées. Une mission de suivi conjointe multi acteurs effectuée
6	Evaluation des activités	Une étude de base (Baseline) et deux évaluations ont été réalisées : - 01 évaluation à mi-parcours - 01 évaluation finale du projet en cours	

conscientisation des jeunes, des techniciens et les autres partenaires plus large sur les

actuels. La gamme de bénéf

ambition plus poussée pour atteindre au cours d
acteurs concernés. Ensuite, il faudrachercher à atteinte des objectifs quantitatifs très ambitieux, et donc, qui reflètent un plus grand impact du projet sur la jeunesse guinéenne(Nous y reviendrons dans les recommandations).

cheval de bataille

pérennité des acquis des actions entreprises. A ce titre, elles occupent une place privilégiée dans le dispositif stratégique des trois m

par les acteurs du projet et les responsables de ces organisations sur le terrain.

une bien meilleure évolution du processus

être renforcés dans leur perception de la finalité de des activités de formation et de leur suivi et dans leur capacité à assurer un service de proximité aux personnes formées à différents niveaux.

Il importe de faire systématiquement une analyse des besoins en formation à tous les niveaux en tenant compte de la diversité des situations pour assurer une bonne mesure

production des impacts positifs à long terme.

Concernant f ' ' " ' … Š ‡ † ‡ • ‹ • ‡ ‡ • à — ˜ " ‡ † — ' " ' Œ ‡ – a valorisation des mécanismes locaux existants et la responsabilisation de tous les acteurs des conflits. En effet, le consortium ACORDWANEP RAJGUI a misé sur une approche inclusive axée sur la valorisation des acquis des précédents projets dans les régions. Ainsi, au lieu de créer des mécanismes nouveaux de préventions et gestions des conflits,

novices dans le domaine de la promotion du dialogue sociale comme outil de prévention et de gestion des conflits locaux.

iquer les leaders religieux et les leaders communautaires dans la promotion du dialogue entre les communautés a servi de levier à ces personnes pour

communautés. Autrement, si ces personnes étaient par le passé, impliquées dans la gestion des conflits, cela se faisait uniquement au sein de leurs communautés

communautés pour, ensemble trouver la solut
s

Dans la plupart des cas, l une bonne perception
et les éloges ont été nombreux lors des différents entretiens dans les communes visitées
aussi bien de la part des jeunes que des autorités nationales et locales

inégalités sexo-spécifiques, (ii) les allocations budgétaires sensibles au genre permettant

la configuration des marqueurs genre selon les politiques publiques avec des indicateurs permettant de les mesurer.

Le projet a su répondre surtout aux deux premières exigences et à certains degrés à la troisième. Cependant, la faiblesse majeure du projet dans la sensibilité « genre » reste la faiblesse des indicateurs précis de mesure de performance des sexo-spécificités qui auraient pu faciliter la désagrégation à tous les niveaux des données de réalisations du projet.

3.5. Durabilité du projet

L'analyse de la durabilité ou pérennité du projet se fera à travers un processus interactif et participatif avec les bénéficiaires et les autres acteurs du projet et sera centrée sur la stratégie du projet.

Le choix des partenaires du consortium composés ONG locales ayant un ancrage communautaire et de solides expériences dans la prévention, la gestion pacifique des conflits locaux, l'accompagnement et la promotion de la participation des jeunes dans la gouvernance locale approche appropriée qui a permis de renforcer l'appropriation nationale par les acteurs locaux eux-mêmes. Aussi, le processus de qui a été placé sous l'autorité du Ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté avec la participation de plusieurs autres Départements ministériels .

Pour atteindre ces objectifs, le projet a mis un accent particulier sur mes.5 4-à renforcer for(n)8(t)5( ) p

Tableau réc ƒ ' ‹ – — Ž ƒ – ‹ ^ † ‡ Ž ï ƒ ' ' " ± … ‹ ƒ – ‹ ' • † ‡ Ž ƒ ~ ‹ ƒ „ ‹ Ž ‹ – ± † — " ƒ „ ‹ Ž

Critères de viabilité / durabilité	Appréciations
Durabilité des résultats et impacts du projet	BON
Amplification des résultats et impacts du projet dans le temps	

4.3. Autres contraintes

L'insuffisance de collaboration entre les partenaires du consortium avec les autres intervenants et la faible coordination sur le terrain de renforcer suffisamment la synergie d'actions, de diversifier les sources financement et de saisir les autres opportunités existantes en faveur des jeunes.

La limitation des zones d'intervention du projet aux centres urbains tandis que la plupart des conflits sont enregistrés dans les communes rurales du pays et la durée relativement courte du projet (18 mois) tes dont le projet a dû faire face.

V. BONNES PRATIQUES, ENSEIGNEMENTS TIRES

5.1. Par rapport à la participation des jeunes dans la consolidation de la paix et la gouvernance locale

A des degrés différents, les jeunes en général et les jeunes Ambassadeurs de la paix en particulier se constituent en associations ou ONG et mènent de démarches auprès des autorités compétentes pour obtenir des reconnaissances juridiques et légales en vue pement.
Certaines deviennent plus actives et opérationnelles en dans les activités de sensibilisation, de formation et médiation pour la gestion des conflits locaux.

Les formations reçues sur le plaidoyer/Lobbying et la participation des Jeunes aux instances de prise de d* n BT /F4 12 Tf 1 0 0 1 183.65 425.3 Tm 0 g 0 G [(d)-11(* n BT /F4 12

Tableau synthétiq ue de la performance du projet

La performance du projet a été appréciée selon les 5 critères conformément aux termes de référence annexés notée sur une échelle de 1 à 5 étoiles :

- Très performant : *****
- Performant : ****
- Plutôt perfo

Impact	Effets immédiats ; Effets long terme ; accès aux opportunités pour les jeunes	**** *	Les effets immédiats du projet sur les bénéficiaires finaux et les partenaires de à long terme sont en cours de de la lutte contre la marginalisation des jeunes dans certaines communes, la prise en compte des questions de la jeunesse dans les communes de façon plus visible. Organisation et renforcement des capacités de la société civile, des jeunes et de leurs organisations. Naissance de plusieurs organisations de jeunes dont les membres commencent à cotiser pour fonctionner. Le projet a changé profondément l « attentiste » de beaucoup de jeunes en présentant un impact très fort sur les rapports de forces même dans les regroupements politiques.
Viabilité/ Pérennité	Renforcement de capacité Partenariats développés	****	Renforcement des capacités des membres du consortium, organisations partenaires des jeunes. Renforcement des capacités institutionnelles, financières, gestionnaires et de plaidoyer, implication des collectivités, mise en place du coaching. La disponibilité des points n BT /F5atio

6.2. Recommandations.

Par rapport aux différents constats, voici les recommandations de l'évaluation :

Pour les autorités de la Guinée :

- Mieux
  de qualité et la coordination nationa ;
- Mobiliser une contrepartie nationale en termes de financement pour donner plus
  dans le pays;
- Contribuer à la capitalisation de cette expérience pour mieux consolider le
  consolidation de la paix en Guinée;
- ministères pour aller
  national. ;
- Accompagner le processus d'opérationnalisation d'un dispositif national d'alerte précoce et d'intervention rapide en Guinée en se basant sur des initiatives existences notamment le Système d'Alerte de la CEDEAO et de WANEP.

Pour le PBF

- uis et le
  renforcement du dispositif de façon à mieux valoriser les ressources humaines nationale financement même sous une autre forme pour permettre de consolider les acquis dont le retour à la paix tant recherchée. A cet effet, le produit de la capitalisation sera un outil important pour mobiliser les moyens nécessaires à la poursuite des actions.
- Contribuer efficacement
  collaborant avec les membres du consortium et les ministères de tutelle dans ion des politiques publiques sectorielles mais aussi des stratégies nationales, y compris les futures générations du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES)

Pour les membres du consortium

- Renforcer la spécificité et la lisibilité des actions du projet dans le pays, qui semble se situer dans la « qualité » de renforcement des capacités dans les
  construction et à la consolidation de la paix en Guinée. A ce titre, il est important pour les membres du consortium de contribuer à la mobilisation

ANNEXES

Annexe 1

Aré ET O q 0 /P <</MCID 4>> 7DC q 0.000008872 0 595.4 841.8 re W* n BT /F4 12 Tf 1 0 0 1 70.825 704

Annexe 1 : Quelques récits de vie des jeunes

Liste des Participants lors des rencontres avec les Acteurs locaux dans la Préfecture de Kouroussa : 22 Septembre 2019

N°	Prénoms et noms	Localités	Structures/Fonctions	Contacts

Rencontre avec les Acteurs locaux (Autorités administratives régionales et Communales, OSC, Jeunes Ambassadeurs) à Kissidougou: 28 Septembre 2019

N°	Prénoms et noms	Localités	Structures/Fonctions	Contacts
152	Yomba Sanoh	Kissidougou	Maire de Commune Urbaine de Kissidougou	(+224) 628 55 19 69
153	Fanta Mady Camara	Kissidougou		

N°

N°	Prénoms et noms	Localités	Structures/Fonctions	Contacts
222	M'bemba Déenko CONDE	Ratoma	WAREAH	(+224) 628 33 41 77
223	Aly SACKO	Ratoma	SIMBAYAGARE	(+224) 621 63 45 14
224	Elizabeth MAMADOUNO	Ratoma	KEITAYA	(+224) 664 64 78 04
225	Amadou Dona CONTE	Ratoma		

Quelques images

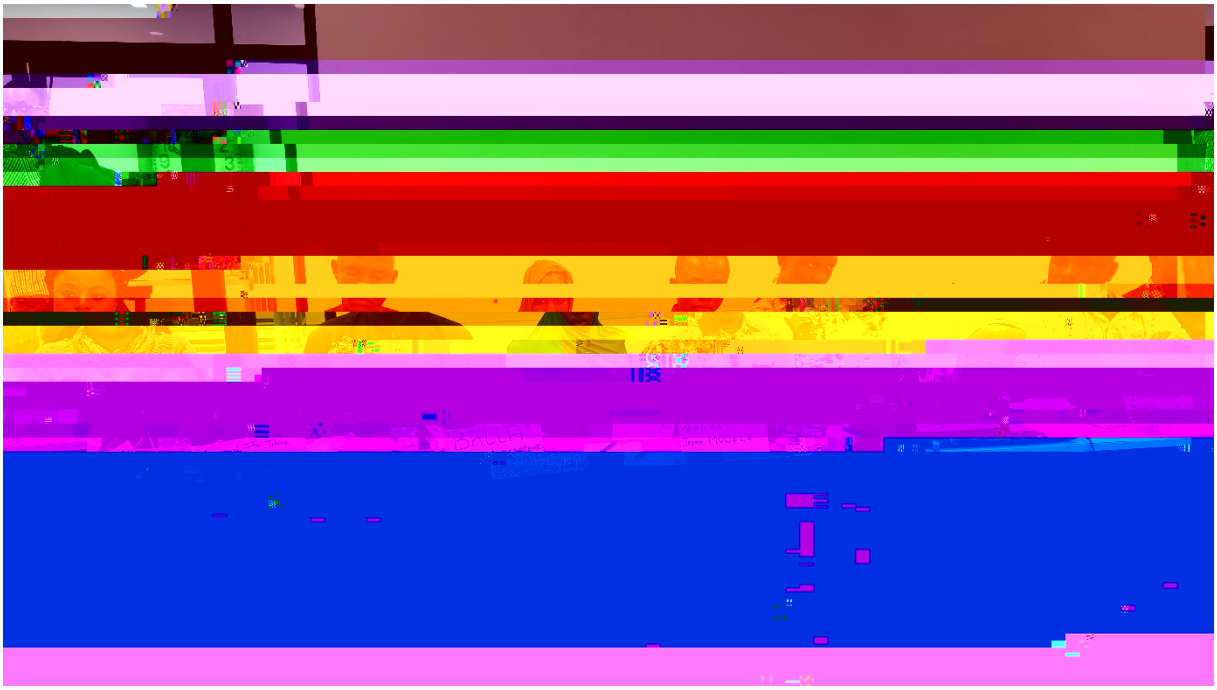

Une vue des participants lors de l'atelier de capitalisation

Une vue des participants lors de l'atelier de capitalisation à Conakry

Une vue de la salle lors de l'atelier de capitalisation du projet

Photo de famille atelier de capitalisation

Une vue du présidium lors d'un panel de l'atelier de capitalisation du projet

Une vue de la salle lors de l'atelier de capitalisation du projet

Visite de courtoisie de l'équipe d'évaluation chez le gouverneur de Kankan (en bleu au centre) en compagnie de le Directeur de cabinet du gouverneur (à gauche) , le Président des OSC de Kankan (en rouge), un jeune leader de Kankan (2ème à partir de la droite) et le chef de projet (1er à partir de la droite)

Image devanture des bureaux octroyés par la Direction sous préfectorale de la jeunesse de Siguiri à l'ONG « Jeunes ambassadeurs pour la paix »
